

## Painel de monitoramento

**A** APROVAÇÃO  
TÁCITA



# Visão geral

Atores

Todos

Status

Todos

Data efetiva de implementação

Último 1 Selecionar Todos

Total de serviços

121

Número de órgãos/entidades

11

Serviços Sem Prazo

22




Serviços previstos

24


Para 2025

19

Para 2026

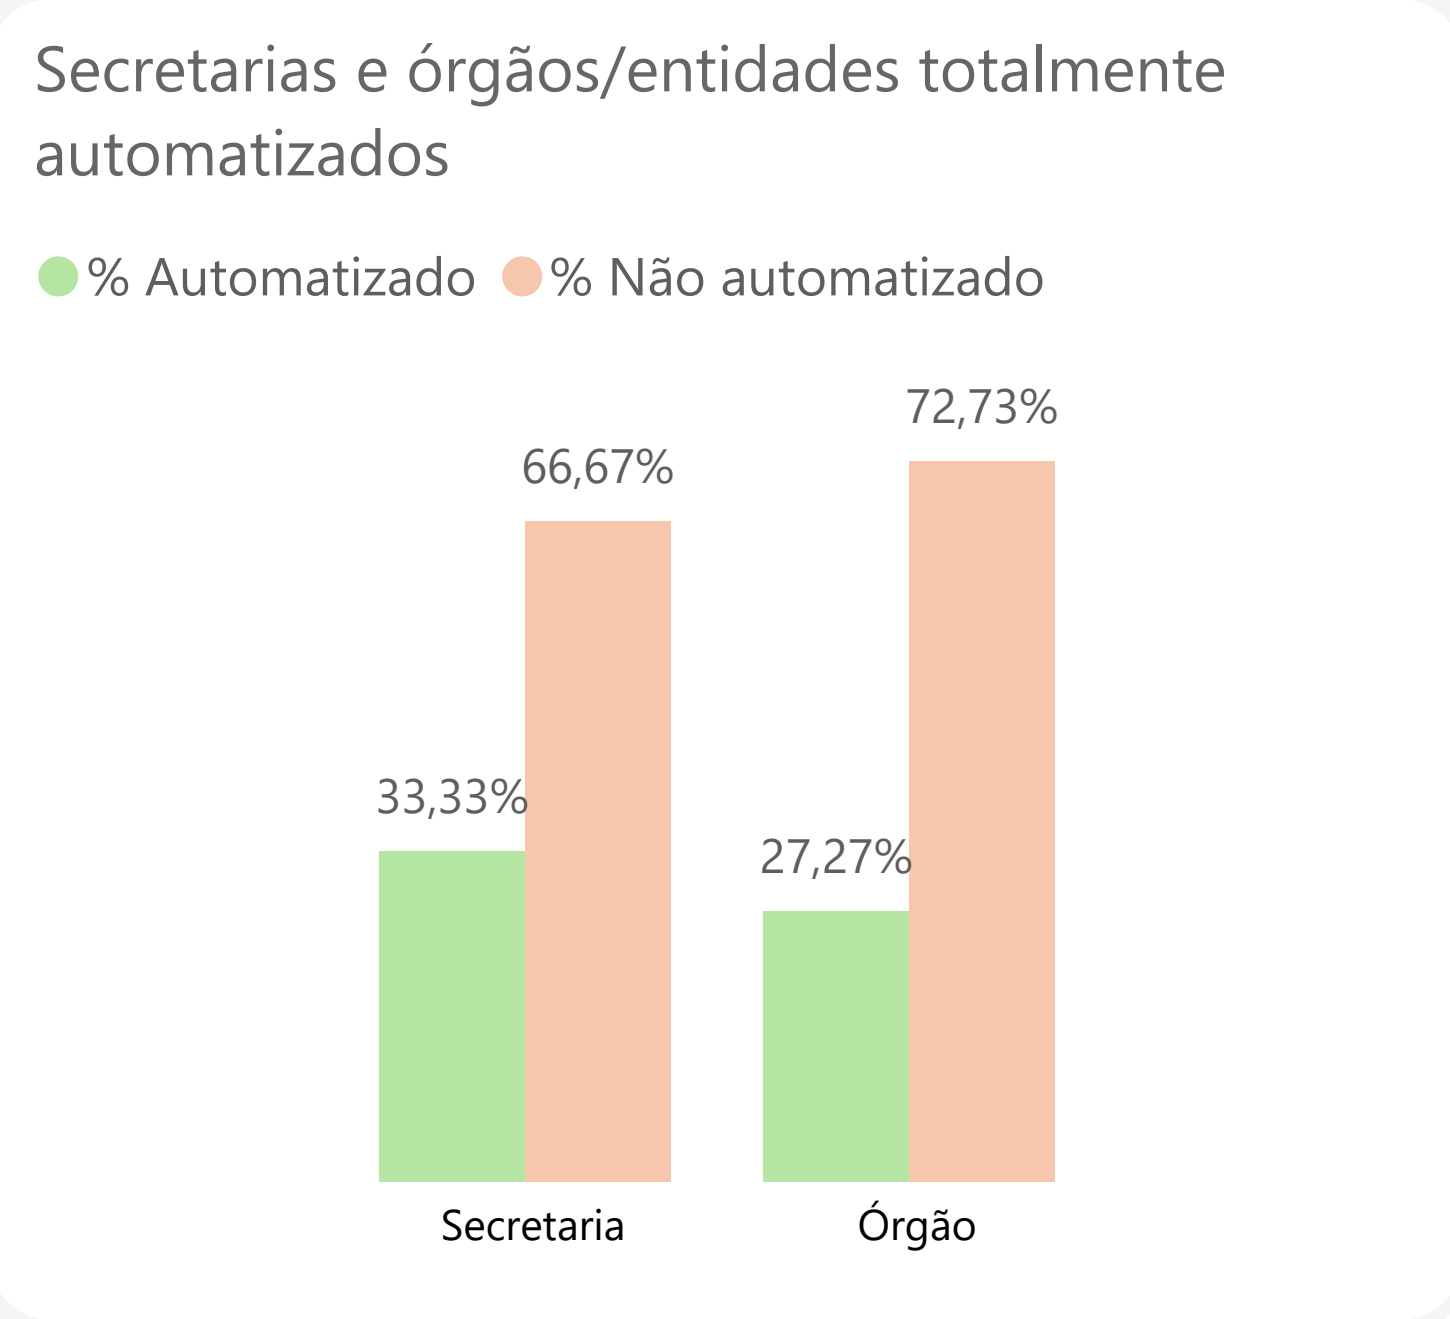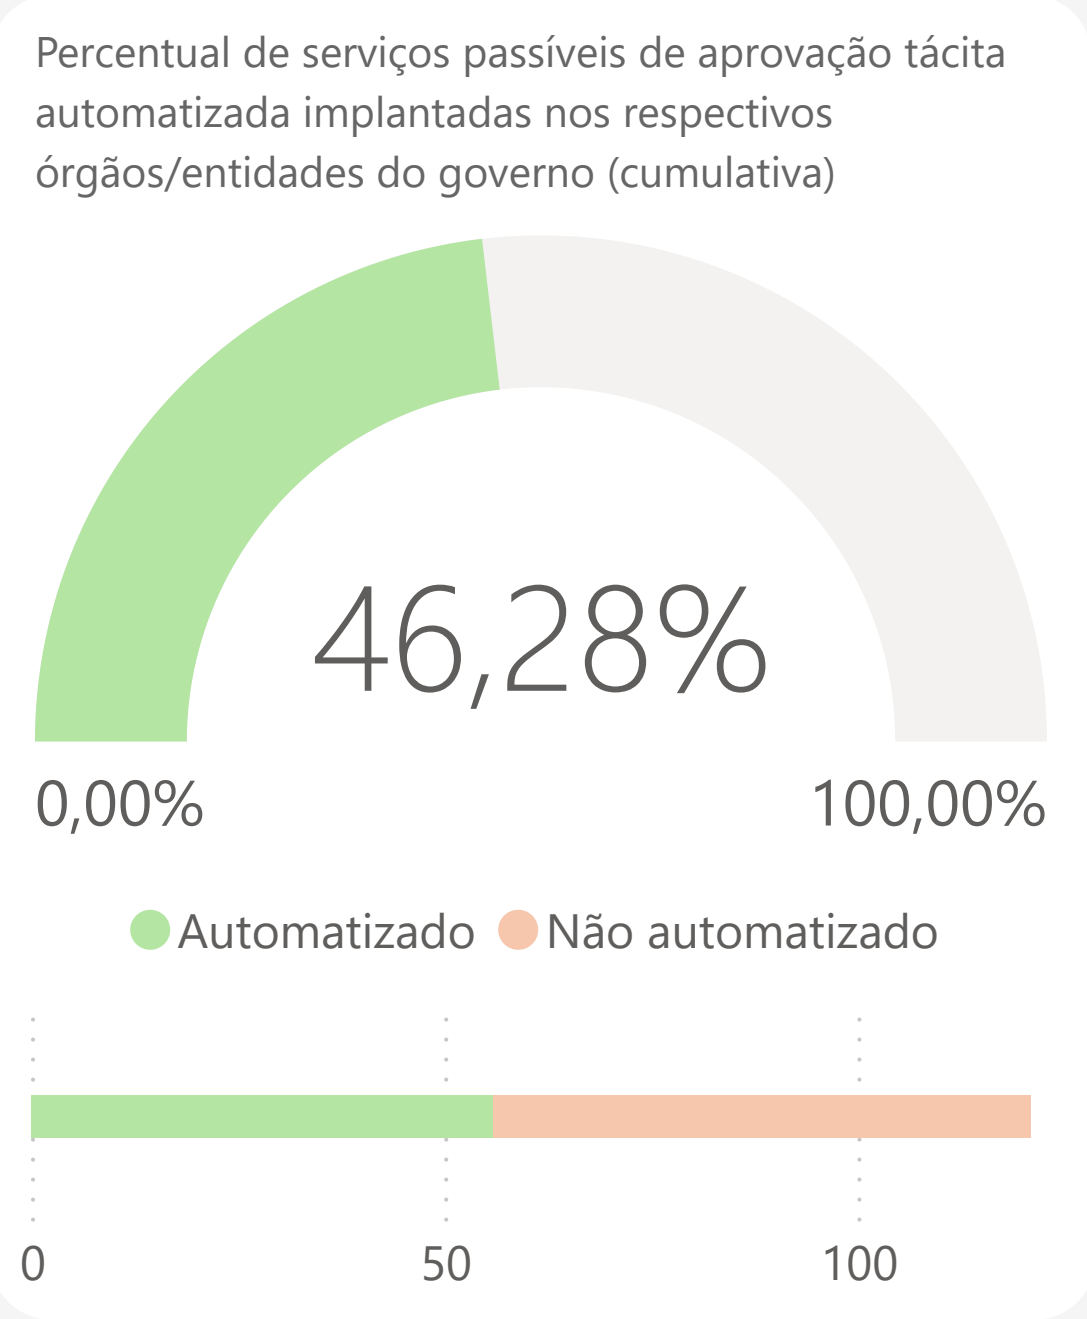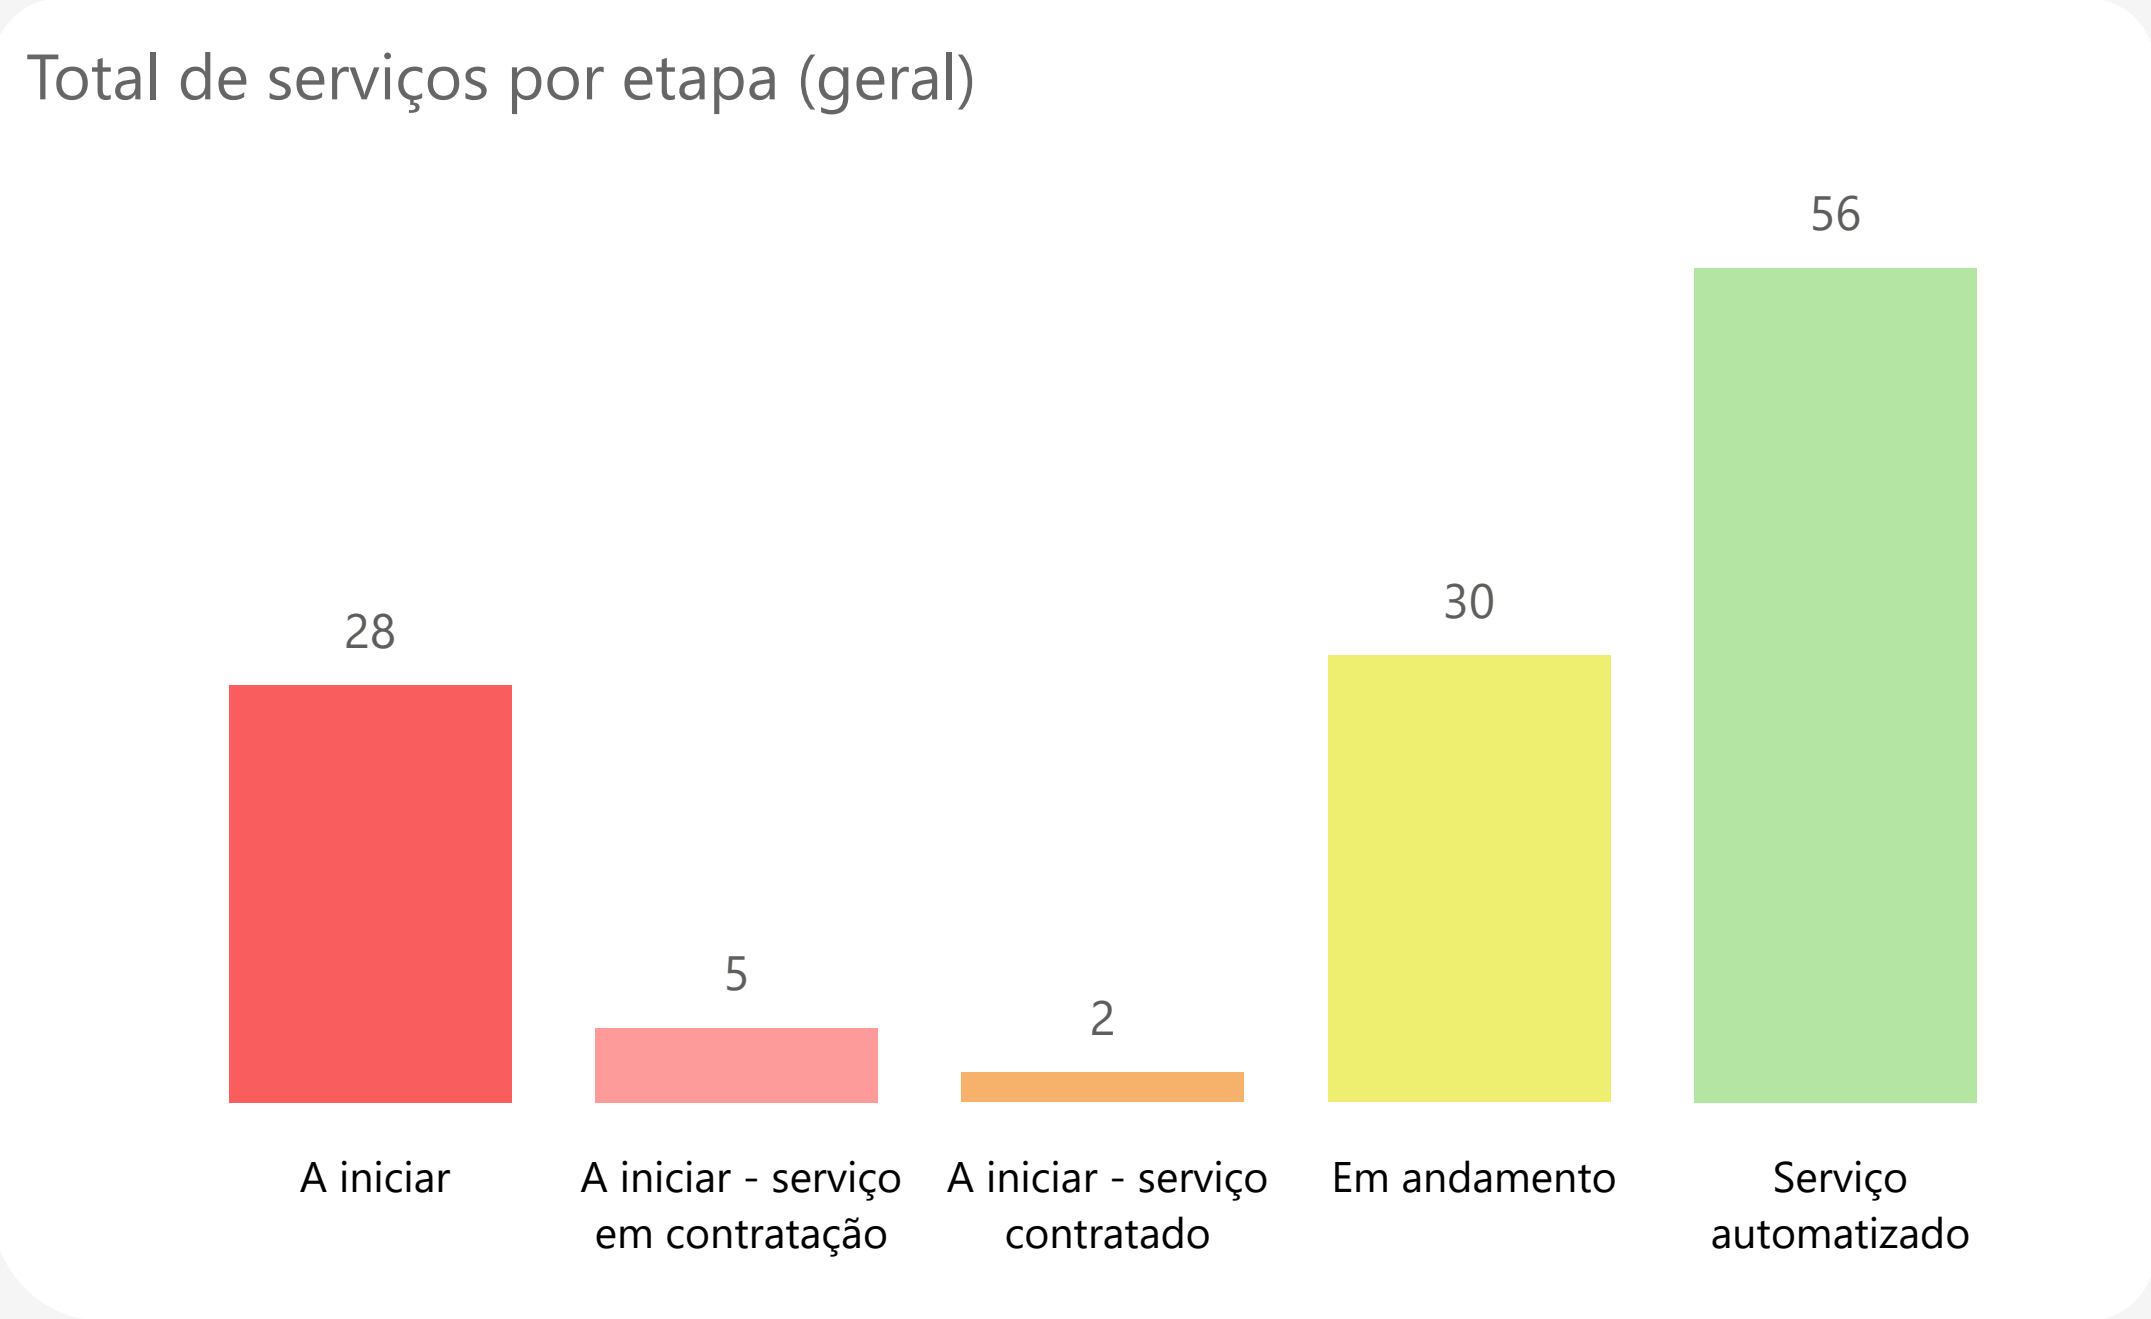

# Monitoramento por sistema



Média de serviços por sistema

13,44

% sistemas totalmente automatizados

33,33%

Data efetiva da implementação

Último ▾

1

Selecionar ▾

Todos ▾

Status agrupado

Status ata

Atores

Status

Serviço


Todos ▾

Todos ▾

Todos ▾

Volume e status dos serviços por sistema

A iniciar A iniciar - serviço contratado A iniciar - serviço em contratação Em andamento Serviço automatizado

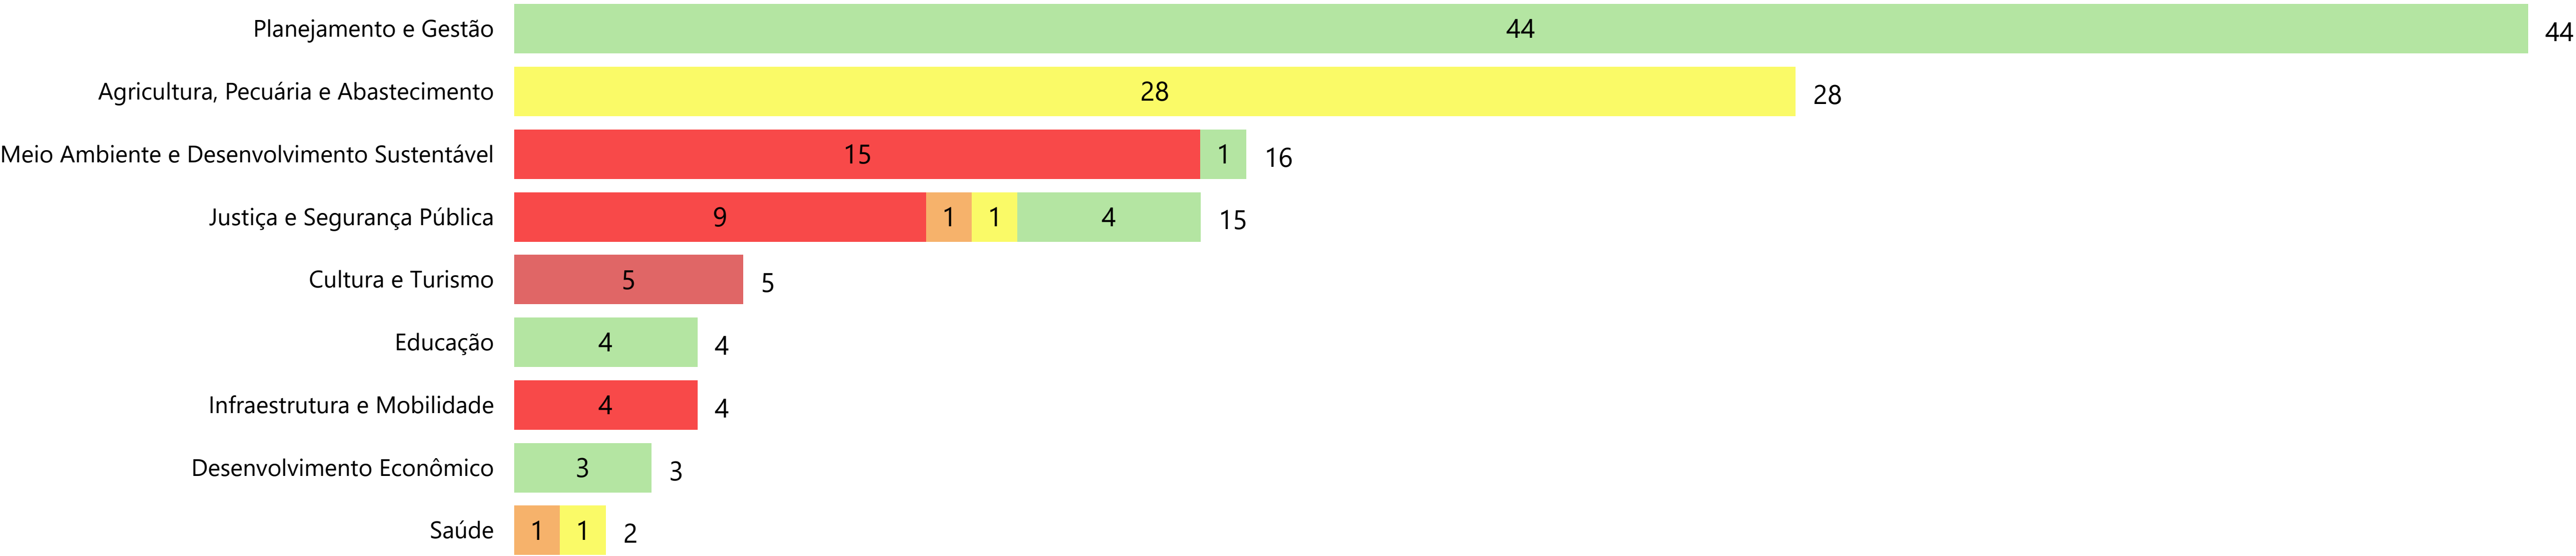

# Monitoramento por órgãos/entidades

Média de serviços por órgão

11

% órgãos totalmente automatizados

27,27%

Status agrupado

Status ata

Data efetiva da implementação

Último ▾

1

Selecionar ▾

Todos ▾

Atores

Todos ▾

Status


Todos ▾

Serviço

Todos ▾

Volume e status dos serviços por órgão

● A iniciar ● Em andamento ● Serviço Automatizado

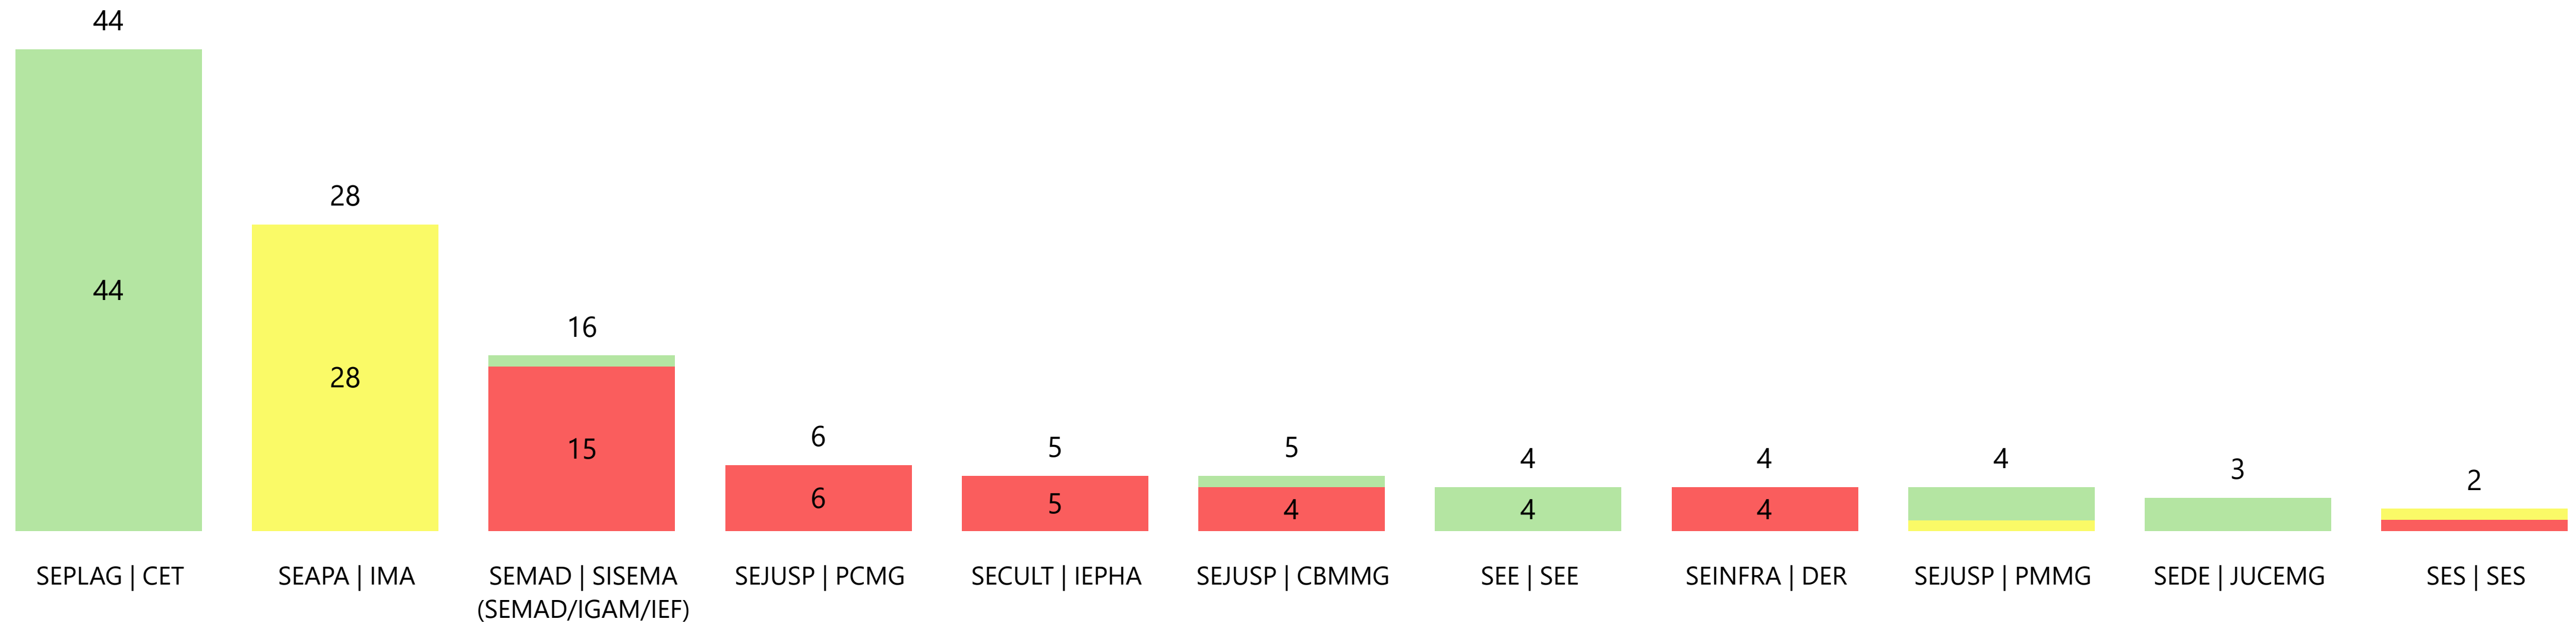

# Monitoramento de serviços

Data da última atualização

Todos

Atores

Todos

Serviço

Todos

Total de serviços

121

Serviços sem prazo

22

Previstos para 2025

24

Previstos para 2026

19

Data efetiva da implementação

Último

1

Selecionar


Todos

Status do prazo

Todos

Previsão

Todos



Controle de prazos e status por órgão

Órgão/entidade	Serviço	Status	Prazo	Data da implementação	Prazo previsto	Observação	Data da última atualização	Dias desde última atualização
SECULT   IEPHA	Análise de eventos	A iniciar	Fora do prazo (61 dias de atraso)		1. SEM PREVISÃO	O prazo para implantação da automatização depende da contratação da ferramenta via contrato corporativo (SEPLAG) que atualmente aguarda deliberação do COFIN. Tendo em vista o prazo do decreto, o órgão, como medida temporária, adotou a planilha de cálculos de prazos de processos elaborada pela SEPLAG. Prazo estimado para automatização: pleito orçamentário SPLOR+COFIN (10 dias) + contratação via contrato corporativo da SEPLAG (não informado) + implementação	02/10/2025	60
SEJUSP   CBMMG	Análise de projeto ou de modificação em projeto aprovado, para fins de emissão de Auto de Vistoria	A iniciar	Fora do prazo (61 dias de atraso)		1. SEM PREVISÃO	Devido ao contingenciamento de gastos, há indisponibilidade de recurso para desenvolvimento de um novo módulo de liberação em framework atualizado. O	30/09/2025	62
